Outlook

DILIGÊNCIA - CE n° 03/2025

De Comissão de Licitação - CPL PMVG <licitacaovg@hotmail.com>
Data Qui, 24/07/2025 10:57
Para Karajas Construção <karajasconstrucoes@gmail.com>

1 anexo (2 MB)
36-_2025_-_DILIGENCIA_-_CE_03_2025_assinado.pdf;

Bom dia Senhores,

Segue em anexo, **NOTIFICAÇÃO DE DILIGÊNCIA – Concorrência Eletrônica n. º 03/2025, que visa a Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia visando a CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE**, solicitamos o envio dos documentos constantes no oficio dentro do prazo estipulado, ou o mais breve possível.

Atenciosamente,

OBS: Favor acusar o recebimento deste e-mail.

Marília Barbosa Benetti Flor

Agente de Contratação

OFÍCIO Nº. 36/2025/SUPLIC/SAD

À

KARAJÁS CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ sob nº 52.346.834/0001-57

RUA DOS KARAJAS, N. 152, QD 26 LOTE 1 SALA 1, BAIRRO QUILOMBO CUIABÁ/MT

Tel.: (65) 99965-6699

E-mail: karajasconstrucoes@gmail.com

ASSUNTO: NOTIFICAÇÃO DE DILIGÊNCIA – ***Concorrência Eletrônica n. º 03/2025****, que visa a* Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia visando a CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, de acordo com as especificações descritas neste Projeto e seus anexos.

Prezado Licitante,

No interesse do Processo Licitatório n. º 1038817/2025, **Concorrência Eletrônica n. º 03/2025** e com fundamento no disposto no inciso III do art. 12 da Lei n. 14.133/2021, observamos a necessidade da promoção de diligência, pois, após conferência e análise da proposta apresentada por vossa senhoria, pela equipe técnica responsável pela elaboração do Projeto Básico e detentores do conhecimento da área de engenharia, conforme exigência do item 6.14 do edital, foi identificada que a composição de preços apresentada, contém inconsistências que a priori são sanáveis.

Desta forma, tendo em vista o princípio do interesse público e tendo por fundamento os termos do instrumento convocatório, os princípios gerais que regem as licitações públicas, as orientações do controle externo, e ainda sob a jurisprudência pátria e a melhor doutrina.

Destaco que deverá ser observado além dos apontamentos feitos, pela equipe, que **são apenas "EXEMPLIFICATIVOS",** analisar se as correções destes erros ocasionem outros erros, e já **proceder a correção de uma vez**, e, com a ciência que caso na apresentação de nova planilha, permanecer com os mesmos erros será considerada a Desclassificação da empresa.

Importante esclarecer que a adoção desse procedimento **não poderá resultar na majoração do valor global da sua oferta**, a qual foi reconhecida como aceitável/exequível no certame licitatório. Cumpre salientar que **não pode haver substituição** dos preços unitários originais bem como de informações que não correspondem a este certame.

Portanto, **CONCEDO** a empresa, **o prazo de 24h (vinte e quatro horas), o qual será considerado o prazo de encerramento às 17:00hs do dia 25/07/2025**, para que esta empresa apresente:

1) **Nova proposta de preços de forma completa, seguindo todas as exigências e padrão estabelecido pela Administração, devidamente assinada bem como em arquivo XLS, escoimada dos erros destacados no parecer da equipe técnica em anexo.**

Caso a empresa não possua interesse de correção dos erros apresentados, solicitamos que seja manifestado via ofício e via chat, destacamos ainda, que o NÃO atendimento a esta convocação, será de inteira responsabilidade da interessada inclusive dos ônus decorrente da perda de negócio, e ainda ficará sujeito a eventuais sanções nos termos do **edital e art. 5ª, inciso IV da Lei nº. 12.846, de 2013**.

Certos de pronto atendimento, elevamos os mais sinceros votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Várzea Grande/MT, 24 de julho de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARILIA BARBOSA BENETTI FLOR
Data: 24/07/2025 11:05:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARILIA BARBOSA BENETTI FLOR

Agente de Contratação

Port. 793/2025

SMECEL
Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Várzea Grande, 23 de julho de 2025.

Referente: Concorrência Eletrônica n° 03/2025

Processo Administrativo: 1038817/2025

Objeto: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia visando a construção do espaço esportivo comunitário, Bairro Capão do Pequi no município de Várzea Grande.

Assunto: Análise Técnica e Parecer Conclusivo sobre a proposta apresentada pela empresa **KARAJÁS CONSTRUÇÃO LTDA**

Em atenção à solicitação constante da remessa nº 894120, registrada no sistema GesPro, na qual Agente de contratações requer análise técnica da proposta apresentada e emissão de parecer conclusivo com vistas a subsidiar a continuidade do presente procedimento licitatório, passamos à exposição dos resultados obtidos.

Da Análise e Parecer Conclusivo

Durante a avaliação criteriosa da proposta apresentada pela empresa KARAJÁS CONSTRUÇÕES LTDA. foram identificadas algumas divergências entre as planilhas apresentadas e as planilhas disponibilizadas pela Administração. Por observar que, a princípio, as inconsistências não comprometem os valores ofertados ou a viabilidade da proposta, recomendamos que as observações sejam encaminhadas a empresa para ajustes e, posterior reenvio a esta equipe para nova análise e emissão de parecer conclusivo. Segue abaixo as inconsistências formais observadas:

Contudo, foram observadas **inconsistências formais** quanto à padronização das planilhas orçamentárias, conforme segue:

- Planilha "ORC TOTAL"

A licitante **modificou os campos "FONTE" e "CÓDIGO SERVIÇO"**, além de **incluir a coluna "TIPO"**, o que diverge do modelo disponibilizado pela Administração.

As modificações estão destacadas nas figuras comparativas (Figuras 1 a 6), onde os itens alterados pela licitante estão marcados em amarelo.

2				PAVIMENTAÇÃO						294.776,10
2.1	Composição	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1450	1,47	1,83	2.131,50	2.653,50
2.2	Composição	Próprio	29C001	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), ESPESSURA DE 10 CM	M3	140	166,69	208,41	23.336,60	29.177,40
2.3	Composição	Próprio	29C002	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.0), ESPESSURA DE 5 CM	M3	70	192,89	241,17	13.502,30	16.881,90
2.4	Composição	Próprio	29C003	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE BRITA), ESPESSURA DE 5 CM	M3	70	192,89	241,17	13.502,30	16.881,90
2.5	Composição	Próprio	29C004	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 42 MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	M2	1400	128,36	160,48	179.704,00	224.672,00
2.6	Composição	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	50,01	30,50	38,13	1.525,30	1.906,88
2.7	Composição	Próprio	29C008	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM	M2	50,01	41,63	52,04	2.081,91	2.602,52
3				ESTRUTURA						28.667,79
3.1	Composição	SINAPI	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	79,3	72,87	91,10	5.778,59	7.224,23
3.2	Composição	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	122	15,02	18,77	1.832,44	2.289,94
3.3	Composição	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	276	12,74	15,92	3.516,24	4.393,92
3.4	Composição	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	5,95	623,39	779,42	3.709,17	4.637,54
3.5	Composição	Próprio	29C007	ESTACA BROCA DE CONCRETO (0,20 X 0,20) M, ESCAVAÇÃO MANUAL, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2"	M	58	139,59	174,52	8.098,22	10.122,16
4				ALVENARIA E FECHAMENTO						77.446,80

Figura 1 Planilha da Licitante – item marcado em amarelo foi modificado

2				PAVIMENTAÇÃO				R$	310.952,05	R$ 388.783,31
2.1	SINAPI	100576		REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.450,00	R$ 1,95	R$	2.827,50	R$ 3.535,22
2.2	CPU	C001		LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N. 1), ESPESSURA DE 10 CM	M3	140,00	R$ 217,63	R$	30.468,20	R$ 38.094,39
2.3	CPU	C002		LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N. 0), ESPESSURA DE 5 CM	M3	70,00	R$ 251,86	R$	17.630,20	R$ 22.043,03
2.4	CPU	C003		LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE BRITA), ESPESSURA DE 5 CM	M3	70,00	R$ 251,86	R$	17.630,20	R$ 22.043,03
2.5	CPU	C004		GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 42 MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	M2	1.400,00	R$ 169,73	R$	237.622,00	R$ 297.093,78
2.6	SINAPI	95241		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	50,01	R$ 40,48	R$	2.017,90	R$ 2.522,38
2.7	CPU	C008		EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM	M2	50,01	R$ 55,11	R$	2.756,05	R$ 3.445,88
3				ESTRUTURA				R$	30.438,17	R$ 38.057,06
3.1	SINAPI	96542		FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	79,30	R$ 96,42	R$	7.646,10	R$ 9.559,91
3.2	SINAPI	96543		ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	122,00	R$ 19,87	R$	2.424,14	R$ 3.030,90
3.3	SINAPI	96545		ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	276,00	R$ 16,84	R$	4.647,84	R$ 5.813,19
3.4	SINAPI	96555		CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	5,95	R$ 824,57	R$	4.906,15	R$ 6.134,20
3.5	CPU	C007		ESTACA BROCA DE CONCRETO (0,20 X 0,20) M, ESCAVAÇÃO MANUAL, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2"	M	58,00	R$ 186,45	R$	10.814,10	R$ 13.520,86

Figura 2 Planilha da Administração

7				EQUIPAMENTOS						4.033,70
7.1	Composição	Próprio	29C005	CONJUNTO PARA FUTEBOL DE CAMPO COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 5,00 X 2,20 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 4", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 3 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1	3.226,19	4.033,70	3.226,19	4.033,70
II	MEIA QUADRA DE BASQUETE									
8				FUNDAÇÃO						3.591,25
8.1	Composição	SINAPI	97082	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	M3	10,5	43,09	53,87	452,44	565,63
8.2	Composição	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	30	0,48	0,60	14,40	18,00
8.3	Composição	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	18	30,50	38,13	549,00	686,34
8.4	Composição	SINAPI	89470	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	24	77,36	96,72	1.856,64	2.321,28
9				PAVIMENTAÇÃO						152.365,23
9.1	Composição	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	221	1,47	1,83	324,87	404,43
9.2	Composição	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	221	30,50	38,13	6.740,50	8.426,73
9.3	Composição	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	221	83,10	103,89	18.365,10	22.959,69
9.4	Insumo	Próprio	29COT-010	PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, PROTEÇÃO UV, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA À BASE DE PU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1	101.246,45	120.574,39	101.246,44	120.574,38
10				EQUIPAMENTOS						3.810,30
10.1	Composição	Próprio	29C006	TABELA DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS, REDES E ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1	3.047,51	3.810,30	3.047,51	3.810,30

Figura 3 Planilha da Licitante – item marcado em amarelo foi modificado

7			EQUIPAMENTOS					R$ 4.266,12	R$ 5.333,92		
7.1	CPU	C005	CONJUNTO PARA FUTEBOL DE CAMPO COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 5,00 X 2,20 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 4", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 3 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R$	4.266,12	R$ 4.266,12	R$	5.333,92
8			MESA QUADRA DE BASQUETE								
8			FUNDAÇÃO					R$ 3.800,25	R$ 4.753,44		
8.1	SINAPI	97082	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	M3	10,50	R$	57,06	R$ 599,13	R$	749,09	
8.2	SINAPI	97064	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	30,00	R$	0,63	R$ 18,90	R$	23,63	
8.3	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	18,00	R$	40,35	R$ 726,30	R$	908,09	
8.4	SINAPI	89470	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	24,00	R$	102,33	R$ 2.455,92	R$	3.070,63	
9			PAVIMENTAÇÃO					R$ 167.511,37	R$	201.887,57	
9.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	221,00	R$	1,95	R$ 420,95	R$	538,81	
9.2	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	221,00	R$	40,35	R$ 8.917,35	R$	11.149,86	
9.3	SINAPI	94964	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	221,00	R$	105,92	R$ 24.252,32	R$	30.372,68	
9.4	COT	COT-010	PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, PROTEÇÃO UV, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA À BASE DE PU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$	133.870,75	R$ 133.870,75	R$	159.426,67	
10			EQUIPAMENTOS					R$ 3.972,77	R$ 4.967,15		
10.1	CPU	C006	TABELA DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM ARCO, REDES E ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R$	3.972,77	R$ 3.972,77	R$	4.967,15	

Figura 4 Planilha da Administração

13				EQUIPAMENTOS						47.262,11
13.1	Insumo	Próprio	29COT-001	PAREDE ESCALADA (2,00 X 1,80)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M111 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	und	2	4.422,49	5.260,74	8.844,98	10.533,48
13.2	Insumo	Próprio	29COT-002	GANGORRA DUPLA (3,00 X 2,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M128 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	und	1	2.793,16	3.326,37	2.793,16	3.326,36
13.3	Insumo	Próprio	29COT-003	BRINQUEDO (4,00 X 5,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, CONTENDO 1 CASINHA, 1 RAMPA DE ACESSO, 1 ESCORREGADOR, 1 ESCADA DE MARINHEIRO E 2 BALANÇOS, REF. MODELO M220 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR	und	1	18.621,04	22.175,79	18.621,04	22.175,79
13.4	Insumo	Próprio	29COT-006	BALANÇO DUPLO (1,50 X 3,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M117 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	und	1	2.094,87	2.494,78	2.094,86	2.494,77
13.5	Insumo	Próprio	29COT-004	BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M312 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	und	6	1.105,63	1.316,69	6.633,76	7.900,12
13.6	Insumo	Próprio	29COT-005	CESTO DE LIXO (0,60 X 0,60)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M313 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	und	1	698,29	831,59	698,29	831,59

Figura 5 Planilha da Licitante – item marcado em amarelo foi modificado

13				EQUIPAMENTOS					R$ 52.474,04	R$	62.491,30
13.1	COT	COT-001		PAREDE ESCALADA (2,00 X 1,80)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M111 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UND	2,00	R$ 5.847,54	R$ 11.695,08	R$	13.927,67
13.2	COT	COT-002		GANGORRA DUPLA (3,00 X 2,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M128 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,00	R$ 3.693,19	R$ 3.693,19	R$	4.398,21
13.3	COT	COT-003		BRINQUEDO (4,00 X 5,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, CONTENDO 1 CASINHA, 1 RAMPA DE ACESSO, 1 ESCORREGADOR, 1 ESCADA DE MARINHEIRO E 2 BALANÇOS, REF. MODELO M220 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR	UN	1,00	R$ 24.621,24	R$ 24.621,24	R$	29.321,43
13.4	COT	COT-006		BALANÇO DUPLO (1,50 X 3,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M117 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,00	R$ 2.769,89	R$ 2.769,89	R$	3.298,66
13.5	COT	COT-004		BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M312 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	6,00	R$ 1.461,89	R$ 8.771,34	R$	10.443,78
13.6	COT	COT-005		CESTO DE LIXO (0,60 X 0,60)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M313 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,00	R$ 923,30	R$ 923,30	R$	1.099,55

Figura 6 Planilha da Administração

- Planilha de "Resumo"

Foi identificado que a licitante removeu **itens** constantes na planilha padrão da Administração, conforme evidenciado nas Figuras 7 e 8.

Planilha Orçamentária Resumida			
Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	FUNDAÇÃO	R$ 8.068,99	0,67 %
2	PAVIMENTAÇÃO	R$ 294.776,10	24,36 %
3	ESTRUTURA	R$ 28.667,79	2,37 %
4	ALVENARIA E FECHAMENTO	R$ 77.446,86	6,40 %
5	REVESTIMENTO	R$ 6.386,36	0,53 %
6	PINTURA	R$ 19.918,34	1,65 %
7	EQUIPAMENTOS	R$ 4.033,70	0,33 %
8	FUNDAÇÃO	R$ 3.591,25	0,30 %
9	PAVIMENTAÇÃO	R$ 152.365,23	12,59 %
10	EQUIPAMENTOS	R$ 3.810,30	0,31 %
11	FUNDAÇÃO	R$ 2.992,71	0,25 %
12	PAVIMENTAÇÃO	R$ 77.252,13	6,38 %
13	EQUIPAMENTOS	R$ 47.262,11	3,91 %
14	PAVIMENTAÇÃO	R$ 88.254,84	7,29 %
15	PINTURA	R$ 34.256,84	2,83 %
16	PAVIMENTAÇÃO	R$ 33.352,66	2,76 %
17	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	R$ 49.961,46	4,13 %
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 64.505,92	5,33 %
19	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R$ 1.719,53	0,14 %
20	DRENAGEM	R$ 32.654,24	2,70 %
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 12.361,50	1,02 %
22	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R$ 56.391,80	4,66 %
23	INSTALAÇÕES DE CANTEIRO E SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 44.723,28	3,70 %
24	SERVIÇOS DIVERSOS	R$ 65.227,61	5,39 %

Figura 7 Planilha da Licitante

SMECEL
Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CUSTO (R$)	TOTAL COM BDI	%
I	CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA			
1	FUNDAÇÃO	8.538,740	10.675,960	0,67%
2	PAVIMENTAÇÃO	310.952,050	388.783,310	24,31%
3	ESTRUTURA	30.438,370	38.057,060	2,38%
4	ALVENARIA E FECHAMENTO	81.936,430	102.445,110	6,41%
5	REVESTIMENTO	6.768,880	8.457,000	0,53%
6	PINTURA	21.095,760	26.376,020	1,65%
7	EQUIPAMENTOS	4.266,120	5.333,920	0,33%
II	MEIA QUADRA DE BASQUETE			
8	FUNDAÇÃO	3.800,250	4.751,440	0,30%
9	PAVIMENTAÇÃO	167.511,370	201.487,520	12,60%
10	EQUIPAMENTOS	3.972,770	4.967,150	0,31%
III	PARQUINHO INFANTIL			
11	FUNDAÇÃO	3.166,870	3.959,520	0,25%
12	PAVIMENTAÇÃO	81.715,880	102.169,350	6,39%
13	EQUIPAMENTOS	52.474,040	62.491,300	3,91%
IV	PISTA DE CAMINHADA			
14	PAVIMENTAÇÃO	93.390,000	116.765,490	7,30%
15	PINTURA	36.246,810	45.319,370	2,83%
V	IMPLANTAÇÃO GERAL			
16	PAVIMENTAÇÃO	35.309,040	44.146,870	2,76%
17	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	55.017,190	66.064,040	4,13%
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	67.796,530	84.765,860	5,30%
19	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.821,550	2.277,460	0,14%
20	DRENAGEM	34.550,180	43.198,070	2,70%
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	13.081,500	16.355,790	1,02%

Figura 8 Planilha da Administração – item marcado em amarelo foi removido na planilha da licitante

- Planilha "CRONOGRAMA"

Houve a remoção das colunas **"ÍNDICE" e "VALOR"** por parte da licitante, o que compromete parcialmente a estrutura prevista (ver Figuras 9 e 10).

SMECEL
Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	FUNDAÇÃO	100,00%	100,00%			
		R$ 8.068,99	R$ 8.068,99	R$ -	R$ -	R$ -
2	PAVIMENTAÇÃO	100,00%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%
		R$ 294.776,10	R$ 58.955,22	R$ 88.432,83	R$ 88.432,83	R$ 58.955,22
3	ESTRUTURA	100,00%	60,00%	40,00%		
		R$ 28.667,79	R$ 17.200,67	R$ 11.467,12	R$ -	R$ -
4	ALVENARIA E FECHAMENTO	100,00%		30,00%	40,00%	30,00%
		R$ 77.446,86	R$ -	R$ 23.234,06	R$ 30.978,74	R$ 23.234,06
5	REVESTIMENTO	100,00%		20,00%	50,00%	30,00%
		R$ 6.386,36	R$ -	R$ 1.277,27	R$ 3.193,18	R$ 1.915,91
6	PINTURA	100,00%				100,00%
		R$ 19.918,34	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 19.918,34
7	EQUIPAMENTOS	100,00%				100,00%
		R$ 4.033,70	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.033,70
8	FUNDAÇÃO	100,00%		100,00%		
		R$ 3.591,25	R$ -	R$ 3.591,25	R$ -	R$ -
9	PAVIMENTAÇÃO	100,00%			50,00%	50,00%
		R$ 152.365,23	R$ -	R$ -	R$ 76.182,62	R$ 76.182,62
10	EQUIPAMENTOS	100,00%				100,00%
		R$ 3.810,30	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.810,30
11	FUNDAÇÃO	100,00%		100,00%		
		R$ 2.992,71	R$ -	R$ 2.992,71	R$ -	R$ -

Figura 9 Planilha da Licitante

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	VALOR SERVIÇO
			30	60	90	120	C/ BDI
01	FUNDAÇÃO	0,67%	10.675,96				10.675,96
	% no PERÍODO		100,00%				
02	PAVIMENTAÇÃO	24,31%	77.756,66	116.634,99	116.634,99	77.756,66	388.783,31
	% no PERÍODO		20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	
03	ESTRUTURA	2,38%	22.834,24	15.222,82			38.057,06
	% no PERÍODO		60,00%	40,00%			
04	ALVENARIA E FECHAMENTO	6,41%		30.733,53	40.978,04	30.733,53	102.445,11
	% no PERÍODO			30,00%	40,00%	30,00%	
05	REVESTIMENTO	0,53%		1.691,40	4.228,50	2.537,10	8.457,00
	% no PERÍODO			20,00%	50,00%	30,00%	
06	PINTURA	1,65%				26.376,02	26.376,02
	% no PERÍODO					100,00%	
07	EQUIPAMENTOS	0,33%				5.333,92	5.333,92
	% no PERÍODO					100,00%	
08	FUNDAÇÃO	0,30%		4.751,44			4.751,44
	% no PERÍODO			100,00%			
09	PAVIMENTAÇÃO	12,60%			100.743,76	100.743,76	201.487,52
	% no PERÍODO				50,00%	50,00%	
10	EQUIPAMENTOS	0,31%				4.967,15	4.967,15
	% no PERÍODO					100,00%	
11	FUNDAÇÃO	0,25%		3.959,52			3.959,52
	% no PERÍODO			100,00%			
12	PAVIMENTAÇÃO	6,39%			30.650,81	71.518,55	102.169,35
	% no PERÍODO				30,00%	70,00%	
13	EQUIPAMENTOS	3,91%				62.491,30	62.491,30
	% no PERÍODO					100,00%	
14	PAVIMENTAÇÃO	7,30%	35.029,65	23.353,10	58.382,75		116.765,49
	% no PERÍODO		30,00%	20,00%	50,00%		
15	PINTURA	2,83%			13.595,81	31.723,56	45.319,37
	% no PERÍODO				30,00%	70,00%	
16	PAVIMENTAÇÃO	2,76%	13.244,06	8.829,37	22.073,44		44.146,87

Figura 10 Planilha da Administração – item marcado em amarelo foi removido na planilha da licitante

- Planilha de "COMPOSIÇÃO"

A licitante promoveu alterações nos **códigos dos itens**, conforme apresentado nas Figuras 11 e 12.

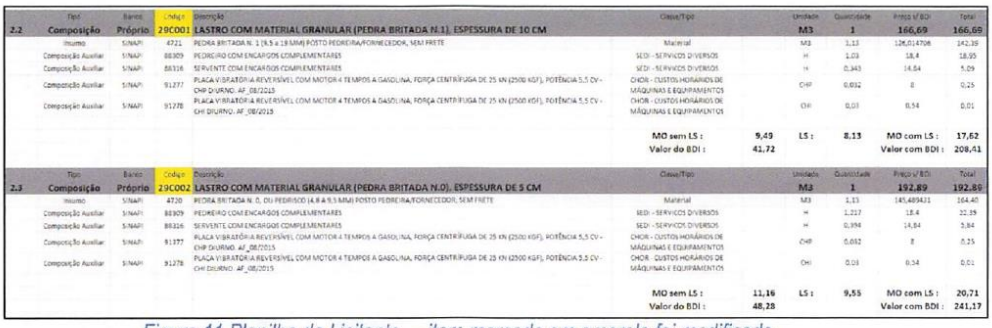

	Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo	Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total
2.2	Composição	Próprio	29C001	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), ESPESSURA DE 10 CM		M3	1	166,69	166,69
	Insumo	SINAPI	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	M3	1,13	126,014708	142,39
	Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,03	18,4	18,95
	Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,343	14,84	5,09
	Composição Auxiliar	SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,032	8	0,25
	Composição Auxiliar	SINAPI	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,03	0,54	0,01
					MO sem LS :	9,49	LS :	8,13	MO com LS : 17,62
					Valor do BDI :	41,72			Valor com BDI : 208,41
	Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo	Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total
2.3	Composição	Próprio	29C002	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.0), ESPESSURA DE 5 CM		M3	1	192,89	192,89
	Insumo	SINAPI	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	M3	1,13	145,489431	164,40
	Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,217	18,4	22,39
	Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,394	14,84	5,84
	Composição Auxiliar	SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,032	8	0,25
	Composição Auxiliar	SINAPI	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,03	0,54	0,01
					MO sem LS :	11,16	LS :	9,55	MO com LS : 20,71
					Valor do BDI :	48,28			Valor com BDI : 241,17

Figura 11 Planilha da Licitante – item marcado em amarelo foi modificado

CPU			C001	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), ESPESSURA DE 10 CM	M3			R$ 217,63	SINAPI 96624
I	4721			PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1,1300	R$ 164,13	R$ 185,46	INSUMO SINAPI
C	88309			PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0300	R$ 24,36	R$ 25,09	SERVIÇO SINAPI
C	88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3430	R$ 19,65	R$ 6,73	SERVIÇO SINAPI
C	91277			PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0320	R$ 10,58	R$ 0,33	SERVIÇO SINAPI
C	91278			PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0300	R$ 0,72	R$ 0,02	SERVIÇO SINAPI
CPU			C002	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.0), ESPESSURA DE 5 CM	M3			R$ 251,86	SINAPI 96622
I	4720			PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1,1300	R$ 189,50	R$ 214,13	INSUMO SINAPI
C	88309			PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2170	R$ 24,36	R$ 29,64	SERVIÇO SINAPI
C	88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3940	R$ 19,65	R$ 7,74	SERVIÇO SINAPI
C	91277			PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0320	R$ 10,58	R$ 0,33	SERVIÇO SINAPI
C	91278			PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0300	R$ 0,72	R$ 0,02	SERVIÇO SINAPI

Figura 12 Planilha da Administração

Ressaltamos que as alterações observadas são de natureza formal e não afetam os valores propostos, tampouco comprometem a análise de viabilidade técnica ou orçamentária da proposta.

Entretanto, a fim de garantir a uniformidade e facilitar futuras análises, medições e fiscalizações, recomendamos que a empresa apresente as planilhas de acordo com o padrão estabelecido pela Administração.

SMECEL
Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Diante do exposto, esta equipe técnica manifesta-se favorável à continuidade do certame, cabendo à Agente de Contratações deliberar sobre a necessidade de saneamento das inconsistências formais mencionadas

Thais Santos
Arquiteta e Urbanista
CAU MT A163253-6
